

Rapport de Projet : PrINTech

Encadrant : Mohamed SELLAMI | Version : 1.0

Adam ALLOU

adam.allou@telecom-sudparis.eu

Arnaud COSTERMANS

arnaud.costermans@telecom-sudparis.eu

Célian GIAUME

celian.giaume@telecom-sudparis.eu

Yanis BELLOT

yanis.bellot@telecom-sudparis.eu

06 Juin 2026

Sommaire du Rapport Final

1. Introduction	2
2. Cahier des charges	3
2.1. Description du sujet	3
2.2. Liste des fonctionnalités de l'application	4
3. Conception	8
3.1. Base de données	8
3.2. Séquence de l'Authentification	9
3.3. Processus d'impression 3D avec PrIntech	10
4. Réalisation et choix techniques	11
4.1. Choix des technologies	11
4.2. Réalisation	12
5. Validation et tests	13
6. Bilan du projet	14
6.1. Plannings	14
6.1.1. Planning prévisionnel	14
6.1.2. Planning final	15
6.1.3. Commentaires	16
6.2. Plan de charges	17
6.2.1. Plan de charges prévisionnel	17
6.2.2. Plan de charges final	18
6.2.3. Commentaires	19
6.3. Difficultés rencontrées	20
7. Conclusion et perspective	21

1. Introduction

Depuis cette année, l'association INTech du campus rencontrait des difficultés de gestion des impressions 3D faites par les membres. En effet, depuis cette année, INTech offre aux membres du campus la possibilité d'imprimer leur modèle 3D en devenant adhérents.

Actuellement, le système de gestion possède des problèmes. Les adhérents doivent télécharger et paramétrer un logiciel appelé slicer qui permet de transformer un modèle 3D en série d'instructions pour les imprimantes 3D, appelé G-code. On demande ensuite aux adhérents de charger le G-code sur les imprimantes, de lancer les impressions et ensuite de remplir un Google Form avec le nom de leur fichier, le poids de l'impression et d'autres paramètres.

Ce système implique beaucoup d'étapes manuelles qui peuvent mener à des erreurs et rendre la fraude facile. Il faut aussi former tout le monde qui devient adhérent à l'utilisation des imprimantes.

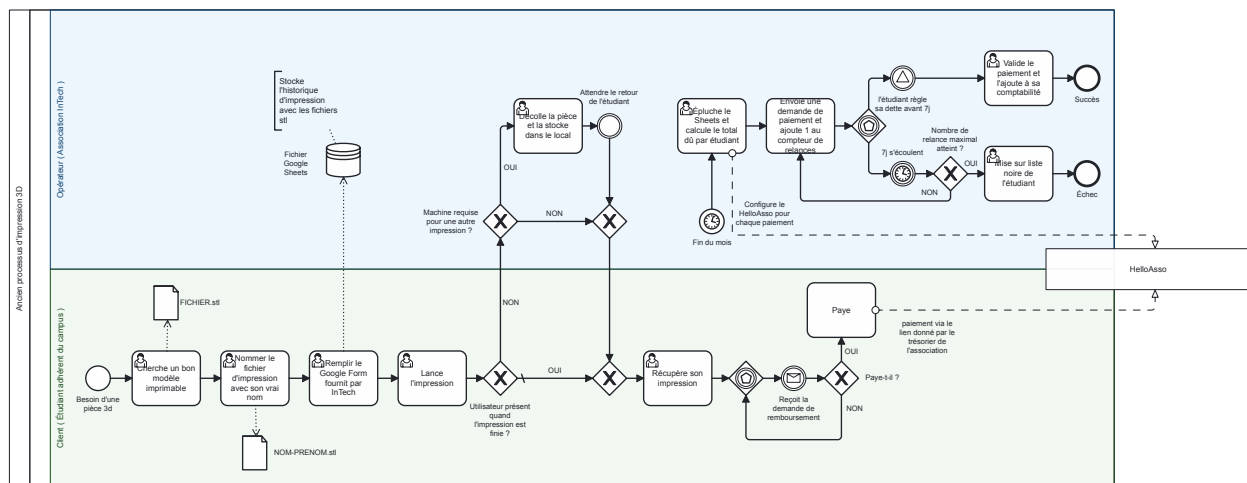


Figure 1: Diagramme BPMN du fonctionnement pré-PrIntech

Intervient alors le projet PrINTech consistant au développement d'une application web dynamique qui permette une gestion des impressions 3D de manière automatique.

Contrairement à la solution existante, ce projet a une vision plus long terme et facilite l'expansion à plus d'imprimantes ou de personnes et permet de réduire la charge de travail du bureau.

2. Cahier des charges

2.1. Description du sujet

Notre projet consiste en la réalisation d'une Application Web dynamique. C'est-à-dire que le site doit être capable d'interagir avec une base de donnée qu'on doit aussi implémenter. Ce site web permettra alors l'identification sécurisé des étudiants voulant imprimer des modèles 3D avec un système de gestion d'utilisateurs, de requêtes, et de gestion de queues.

2.2. Liste des fonctionnalités de l'application

Afin de répondre au sujet, l'application doit intégrer les fonctionnalités suivantes, classées par priorité de développement :

ID	Fonctionnalité de l'application	Description technique	Priorité
F01	Authentification	Connexion et déconnexion via Django Auth.	Haute
F02	Gestion des profils	Affichage et modification des informations utilisateurs.	Basse
F03	Gestion des impressions	Flux complet d'impression 3D, du dépôt STL à la mise en file.	Haute
F03-1	Déposer un STL	Upload d'un fichier STL.	Haute
F03-2	Slicer automatique	Convertir le modèle en G-code via un slicer.	Moyenne
F03-3	Estimation du coût	Calculer le prix d'impression à partir des paramètres.	Basse
F03-4	Position dans la file	Afficher la place du travail dans la file.	Basse

ID	Fonctionnalité de l'application	Description technique	Priorité
F03-5	Priorité projets INTech	Autoriser certains utilisateurs à prioriser leurs travaux.	Basse
F03-6	Crédit restant	Afficher le crédit restant d'un utilisateur.	Basse
F03-7	Quantité d'impressions	Indiquer le nombre d'exemplaires à imprimer.	Basse
F04	Espace administrateur	Interface d'administration pour une gestion complète.	Moyenne
F04-1	Gestion des utilisateurs	Créer, modifier et supprimer les utilisateurs.	Haute
F04-2	Gestion des travaux	Créer, modifier et supprimer la file de travaux.	Moyenne
F04-3	Reprise des erreurs	Déclarer un travail en erreur et le remettre en file.	Moyenne
F05	Intégrations	SSO et notifications externes.	Pour aller plus loin

ID	Fonctionnalité de l'application	Description technique	Priorité
F05-1	Intégration CAS	Inscription et connexion via le CAS de l'école.	Pour aller plus loin
F05-2	Intégration Discord	Utiliser des web-hooks pour les notifications.	Pour aller plus loin
F05-3	Intégration HelloAsso	Créditer les comptes via HelloAsso.	Pour aller plus loin
F06	Impression technique	Options avancées d'impression.	Pour aller plus loin
F06-1	Utilisation de supports	Détecter quand l'utilisation de supports est nécessaire.	Pour aller plus loin
F06-2	Paramétrage du slicer	Permettre l'upload d'un JSON de paramètres.	Pour aller plus loin
F06-3	Choix des matériaux	Choisir un plastique autre que le PLA.	Pour aller plus loin
F07	Gestion des filaments	Administration des filaments et du stock.	Pour aller plus loin
F07-1	Activation des filaments	Activer et désactiver des filaments.	Pour aller plus loin

ID	Fonctionnalité de l'application	Description technique	Priorité
F07-2	Gestion des filament	Gérer la quantité de filament restant.	Pour aller plus loin
F07-3	Gestion de consommation	Rapport sur quantités, crédits et montant imprimé.	Pour aller plus loin

3. Conception

3.1. Base de données

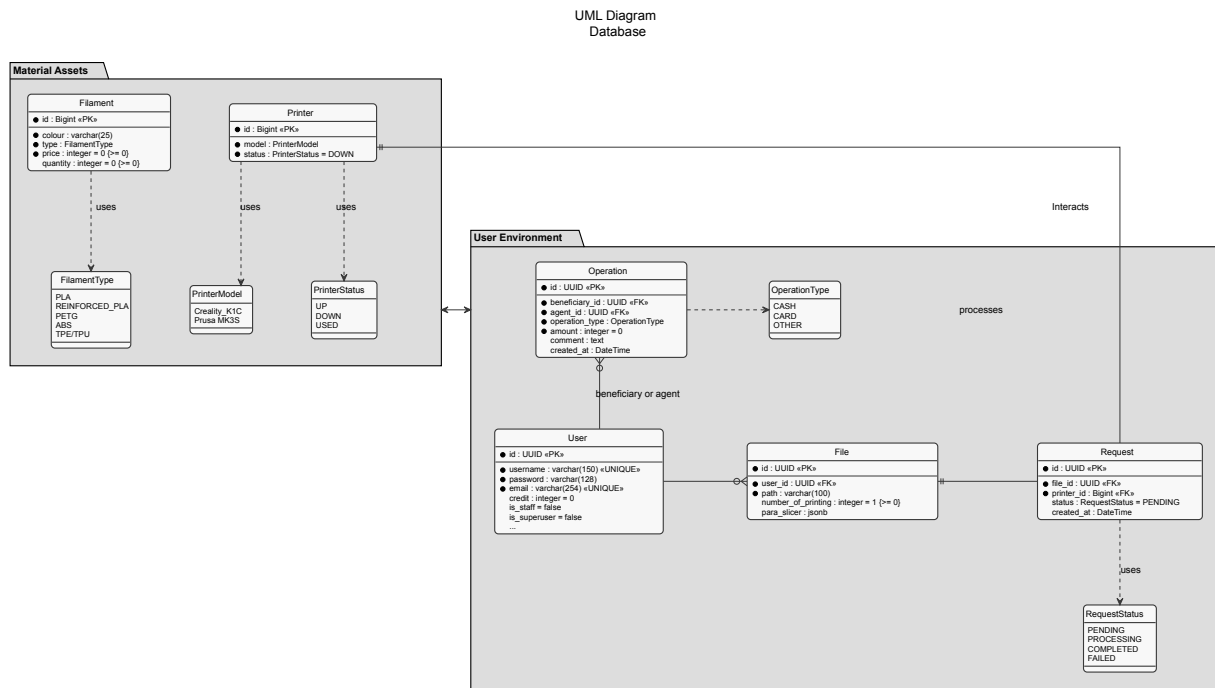


Figure 2: Schema de base de données

3.2. Séquence de l'Authentification

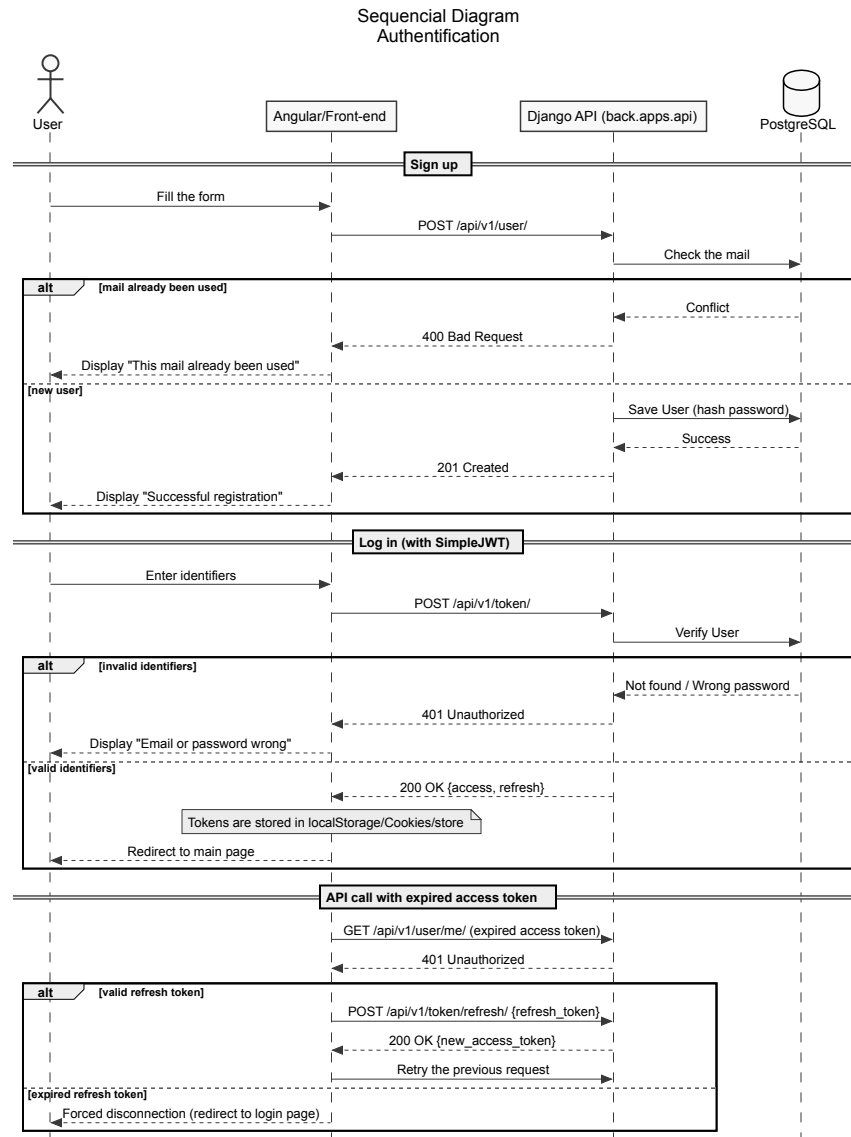


Figure 3: Schema de l'authentification

3.3. Processus d'impression 3D avec PrIntech

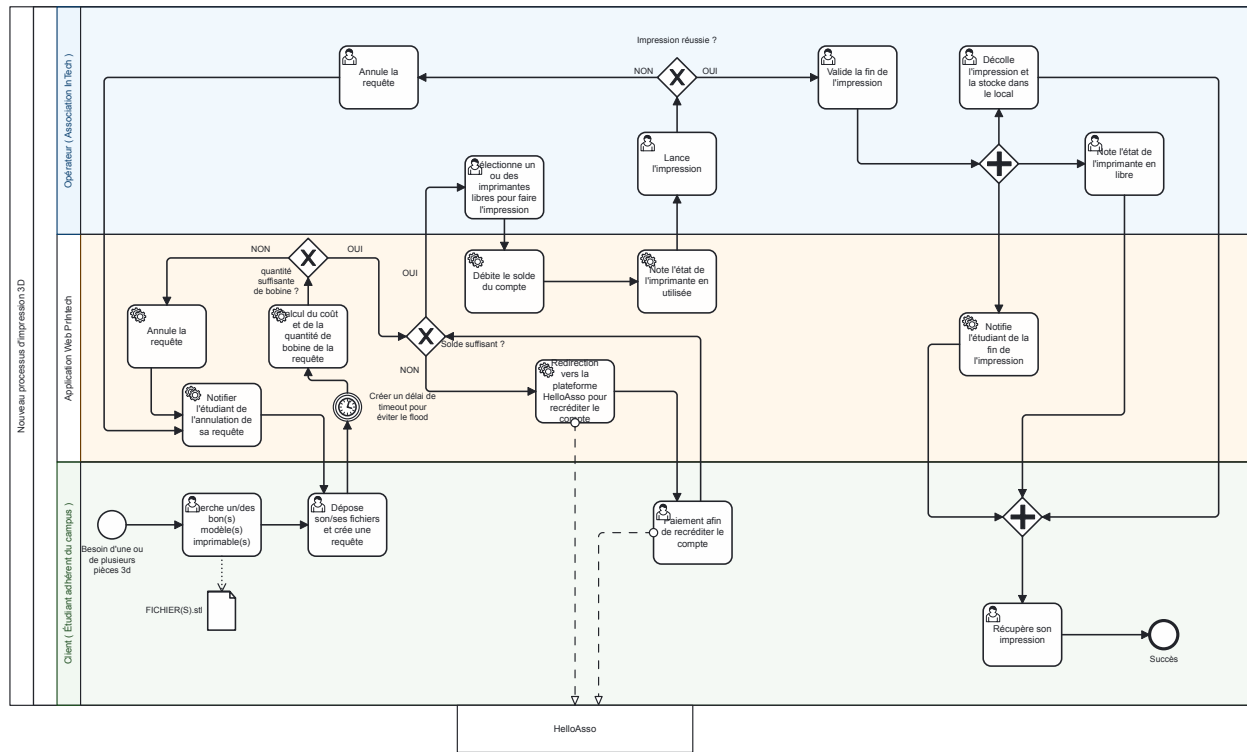


Figure 4: Diagramme BPMN du fonctionnement post-PrIntech

4. Réalisation et choix techniques

4.1. Choix des technologies

Les technologies pour développer une Application Web sont nombreuses. Pour faire la sélection des technologies, nous avons d'abord examiné lesquelles étaient capables de répondre à notre cahier des charges, puis ensuite sur les technologies auxquelles les membres de notre équipe avaient déjà de l'expérience. Sur la base de ces critères, nous avons sélectionné le stack suivant. D'abord pour le frontend :

- **AngularJS** : pour réaliser le frontend

Ensuite pour le backend :

- **Django** : pour réaliser le backend et l'API REST
- **PostgreSQL** : pour la base de données de l'application
- **Klipper** : comme firmware des imprimantes. Ce firmware communautaire vient remplacer celui du constructeur
- **Moonraker** : expose les API JSON-RPC de Klipper avec une API REST

Afin de partitionner logiquement les différentes couches (Frontend, Backend, et la Base De Données), nous avons utilisé **Docker** puisque c'est une technologie largement utilisée professionnellement qui permet la conteneurisation puis ensuite simplifie le déploiement.

Finalement, le déploiement sera assuré par **Nginx** avec **Gunicorn**.

4.2. Réalisation

Afin de gérer nos librairies et versions de python, on a utilisé uv. C'est un équivalent de poetry mais en plus optimisé car implémenté en Rust. On doit alors préciser avant chaque commande “uv run” afin que le processus passe bien par uv.

Pour la conteneurisation, il a fallu créer les conteneurs. Pour se faire, il faut configurer un fichier “docker-compose.yaml” afin qu'il crée un conteneur PostgreSQL configuré sur le bon port après la commande.

Enfin pour la mise en commun du code, on a utilisé Git, et plus particulièrement git flow qui permet de produire simplement un cadre de travail professionnel (avec les branches main, develop, features/... etc.) et des commandes qui facilitent son utilisation.

5. Validation et tests

6. Bilan du projet

6.1. Plannings

6.1.1. Planning prévisionnel

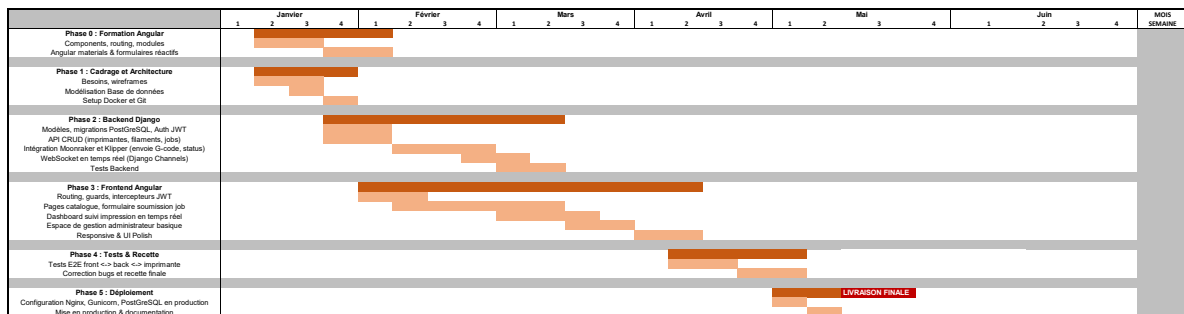


Figure 5: Planning prévisionnel du projet PrIntech

6.1.2. Planning final

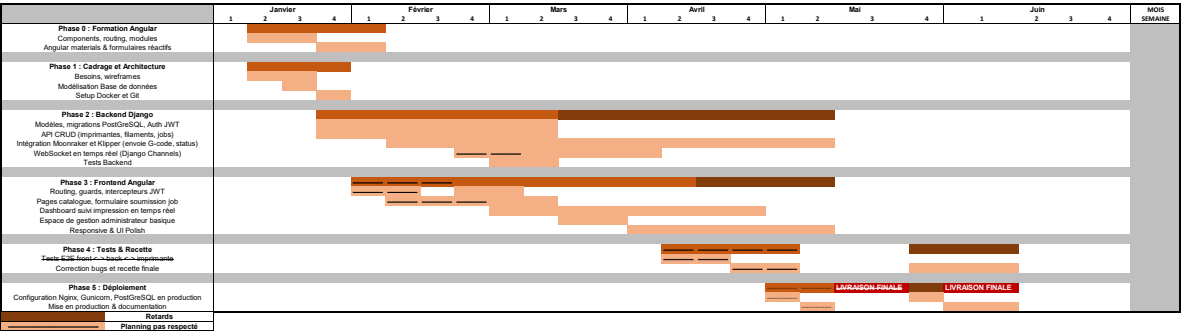


Figure 6: Planning final du projet PrIntech

6.1.3. Commentaires

- **Choix du planning prévisionnel :**
 - Angular est appris en parallèle du projet. Le dev front ne commence qu'en février.
 - Django est maîtrisé -> exécution rapide. La partie Moonraker/Klipper est la plus incertaine.
 - la phase 3 est la plus longue à cause de l'apprentissage en cours.
 - **Comparaison au planning réel :**
 - le projet a accumulé du retard notamment en raison d'autres dates importantes comme les projets Gate ou bien les partiels mais aussi car on a sous-estimé la complexité de certaines tâches que nous verrons plus bas.
 - en réponse, on a ré-évalué le périmètre de notre projet afin d'en inclure à la date du rendu que les fonctionnalités nécessaires au vu du cahier des charges (Pas de tests e2e pour l'instant)
 - Ce retard n'est pas une fatalité puisque compte tenu de l'utilité du projet, celui-ci sera poursuivi à bien au-delà de la date de rendu.
-

6.2. Plan de charges

6.2.1. Plan de charges prévisionnel

Exemple à adapter à chaque projet							SUIVI D'ACTIVITÉS (Charge Consommée)					
PLAN DE CHARGES PRÉVISIONNEL							SUIVI D'ACTIVITÉS (Charge Consommée)					
Description de l'activité	Charge en %	Charge en H	Charge en H / Participant				Charge en %	Charge en H	Charge en H / Participant			
			Arnaud	Yanis	Célan	Adam			Arnaud	Yanis	Célan	Adam
Total	100%	206,00	52,00	51,00	51,00	52,00	100%	27,25	8,50	6,75	5,50	6,50
Gestion de projets	23%	47,50					40%	11,00				
Réunion de lancement	1%	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75	11%	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Planning prévisionnel et Suivi d'activités	2%	4,50	1,50	1,00	1,00	1,00	4%	1,00	1,00			
Réunions de suivi	12%	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0%	0,00				
Rédaction	8%	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00	26%	7,00	2,00	2,00	1,00	2,00
Spécification	2%	4,00					11%	3,00				
Définition des fonctionnalités	2%	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11%	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Conception préliminaire	6%	13,00					45%	12,25				
Définition d'un modèle de données	2%	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12%	3,25	0,75	1,00	0,75	0,75
Définition des fonctionnalités	4%	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	29%	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Définition des technologies	0%	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	4%	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Conception détaillée	29%	59,50					0%	0,00				
Définition des classes	3%	6,50	0,50	2,00	2,00	2,00	0%	0,00				
Définition des méthodes	3%	6,50	0,50	2,00	2,00	2,00	0%	0,00				
Définition des tests unitaires	0%	0,50	0,50				0%	0,00				
Auto-formation	19%	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0%	0,00				
Maquettage des interfaces	3%	6,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0%	0,00				
Codage	21%	44,00					0%	0,00				
Codage des classes	5%	10,00	2,00	3,00	4,00	1,00	0%	0,00				
Codage des méthodes	11%	23,00	3,00	8,00	7,00	5,00	0%	0,00				
Codage des tests unitaires	5%	11,00	1,00	3,00	3,00	4,00	0%	0,00				
Intégration	11%	22,00					4%	1,00				
Intégration des modules	2%	5,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0%	0,00				
Tests d'intégration	3%	7,00	1,00	2,00	1,00	3,00	0%	0,00				
Intégration au Imprimantes	5%	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4%	1,00	1,00			
Soutenance	8%	16,00					0%	0,00				
Préparation de la soutenance	6%	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0%	0,00				
Soutenance	2%	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	0,00				

Figure 7: Plan de Charge prévisionnel

6.2.2. Plan de charges final

6.2.3. Commentaires

Nous avons bien utilisé le temps imparti. Celui-ci nous a permis de nous former non seulement sur les technologies auxquelles nous étions assignées mais aussi à comprendre l'ensemble du code que ce soit le front ou le back.

Nous sommes ainsi parvenu à rendre notre profil beaucoup plus attractif avec une compréhension plus fine des abstractions des différentes technologies mais aussi une vision beaucoup moins étroite de notre champ d'action.

Pour indication, Célian ne connaissait pas Django au démarrage du projet, Adam démarrait sur Angular et Yanis était surtout focalisé sur Django; maintenant, nous sommes tous en mesure de comprendre le code de l'autre et de le corriger à travers un système de PR (Pull Request) sur Git.

6.3. Difficultés rencontrées

Notre projet, malgré un produit final assez satisfaisant, a été le théâtre de certaines difficultés qui nous ont poussé à modifier notre champ d'action :

- La mise en commun du travail a été plus nébuleuse que prévu (notamment après l'instauration de PR qui ont empêchés le bon fonctionnement de certaines commandes de git flow)
 - les retards accumulés qui ont sapé l'efficacité du projet malgré un démarrage rapide
 - l'utilisation des APIs des imprimantes 3D : Notre objectif initial était de relier directement les imprimantes 3D à l'application grâce au logiciel FDM Monster. Cependant, cette configuration s'est révélée difficile en raison des systèmes propriétaires des machines. De plus, comme les imprimantes sont très sollicitées, nous avons temporairement configuré le site pour qu'un administrateur lance chaque impression manuellement. Nous continuons néanmoins à travailler sur l'automatisation de ce processus.
-

7. Conclusion et perspective

Malgré des difficultés, notre projet a produit une Application Web fonctionnelle selon les critères que nous nous étions imposés en préambule avec le cahier des charges.

Tout du moins, nous souhaiterions peaufiner ce projet au-delà du rendu final, que ce soit par la continuation de celui-ci par un autre groupe de projet informatique, ou bien par la maintenance de celui-ci par l'Association Intech elle-même. En effet, ce projet est un projet enrichissant pour un étudiant ingénieur dans le développement informatique à travers l'utilisation d'outils et de technologies professionnels qui s'intègre pleinement dans le cadre de nos études et du campus avec Intech.

Ce projet, au-delà de la réalisation purement technique, est aussi une expérience d'équipe avec tout ses avantages et ses défauts qu'on a expérimenté (comme les retards et la mise en commun du code). Cela en fait donc une force pour tous nos futurs projets en groupe.
